

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年09月12日

計画の名称	明日香村における快適で活力ある暮らしの実現と下水道施設における事業継続性の確保。(第2期)												
計画の期間	平成29年度～平成33年度(5年間)								重点配分対象の該当				
交付対象	明日香村												
計画の目標	上位計画である第4次明日香村整備計画に基づき未普及対策として生活環境の改善による快適で活力ある暮らしの実現、健全な発展と公衆衛生の向上に寄与するために、下水道の未普及地域の整備を進め今期で新規事業について完了を目指す。 また、下水道ストックマネジメント計画の策定を行い、更新事業についての検討を行う。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	54	A	54	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		平成29当初	平成31年末	平成33年末
1	下水道処理人口普及率を97%から100%に向上を図る。 下水道処理人口普及率を97%から100%に向上を図る。 供用開始人口/行政区域内人口×100=下水道処理人口普及率(%)	97%	98%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																				
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名	事業内容	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		種別	種別	対象	間接		種別1	種別2	(事業箇所)	(延長・面積等)		H29	H30	H31	R02	R03				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-001	下水道	一般	明日香村	直接	明日香村	管渠 (新設	高取川第3処理分区 (未普	污水管Φ200 653m 圧送管	明日香村	■					10		—	
		汚水)					及対策)													
	A07-003	下水道	一般	明日香村	直接	明日香村	管渠 (新設	飛鳥川第2処理分区 (未普	污水管Φ200 77m	明日香村	■					4		—	
		汚水)					及対策)													
	A07-004	下水道	一般	明日香村	直接	明日香村	管渠 (新設	飛鳥川第1-1処理分区 (污水管Φ200 100m	明日香村				■		10		—	
		汚水)					未普及対策)													
	A07-005	下水道	一般	明日香村	直接	明日香村	管渠 (—	明日香村全体 (効率的な	効率的な事業実施に伴う計画	明日香村	■					13		—	
		汚水)					策定		事業実施に伴う計画策定	策定										
	A07-006	下水道	一般	明日香村	直接	明日香村	管渠 (—	明日香村全体 (ストック	ストックマネジメント計画策	明日香村					■	17		—	
		汚水)					策定)		マネジメント計画策定	定										
											小計						54			
											合計						54			

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

明日香村地域づくり課において事後評価を実施する。

事後評価の実施時期

事業終了後

公表の方法

明日香村ホームページにて公表

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

高取川第3処理分区及び、飛鳥川第1-1処理分区、第2処理分区において未普及対策を行い、公衆衛生の向上に寄与した。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）


明日香村公共下水道全体計画区域内における施設整備を引き続き実施し、生活環境の改善及び公衆衛生の向上に寄与していく。
またストックマネジメント計画の策定を行い、下水道施設の効率的な計画管理を行っていく。

○目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	下水道人口普及率	
	最終目標値	100%
	最終実績値	97%
		社会情勢による人口減少に伴い目標値に達することが出来なかった。

(参考様式3)

(参考図面) 社会資本総合整備計画(水の安全・安心基盤整備)


計画の名称	明日香村における快適で活力ある暮らしの実現と下水道施設における事業継続性の確保。(第2期)		
計画の期間	平成29年度 ~ 平成33年度 (5年間)	交付対象	明日香村

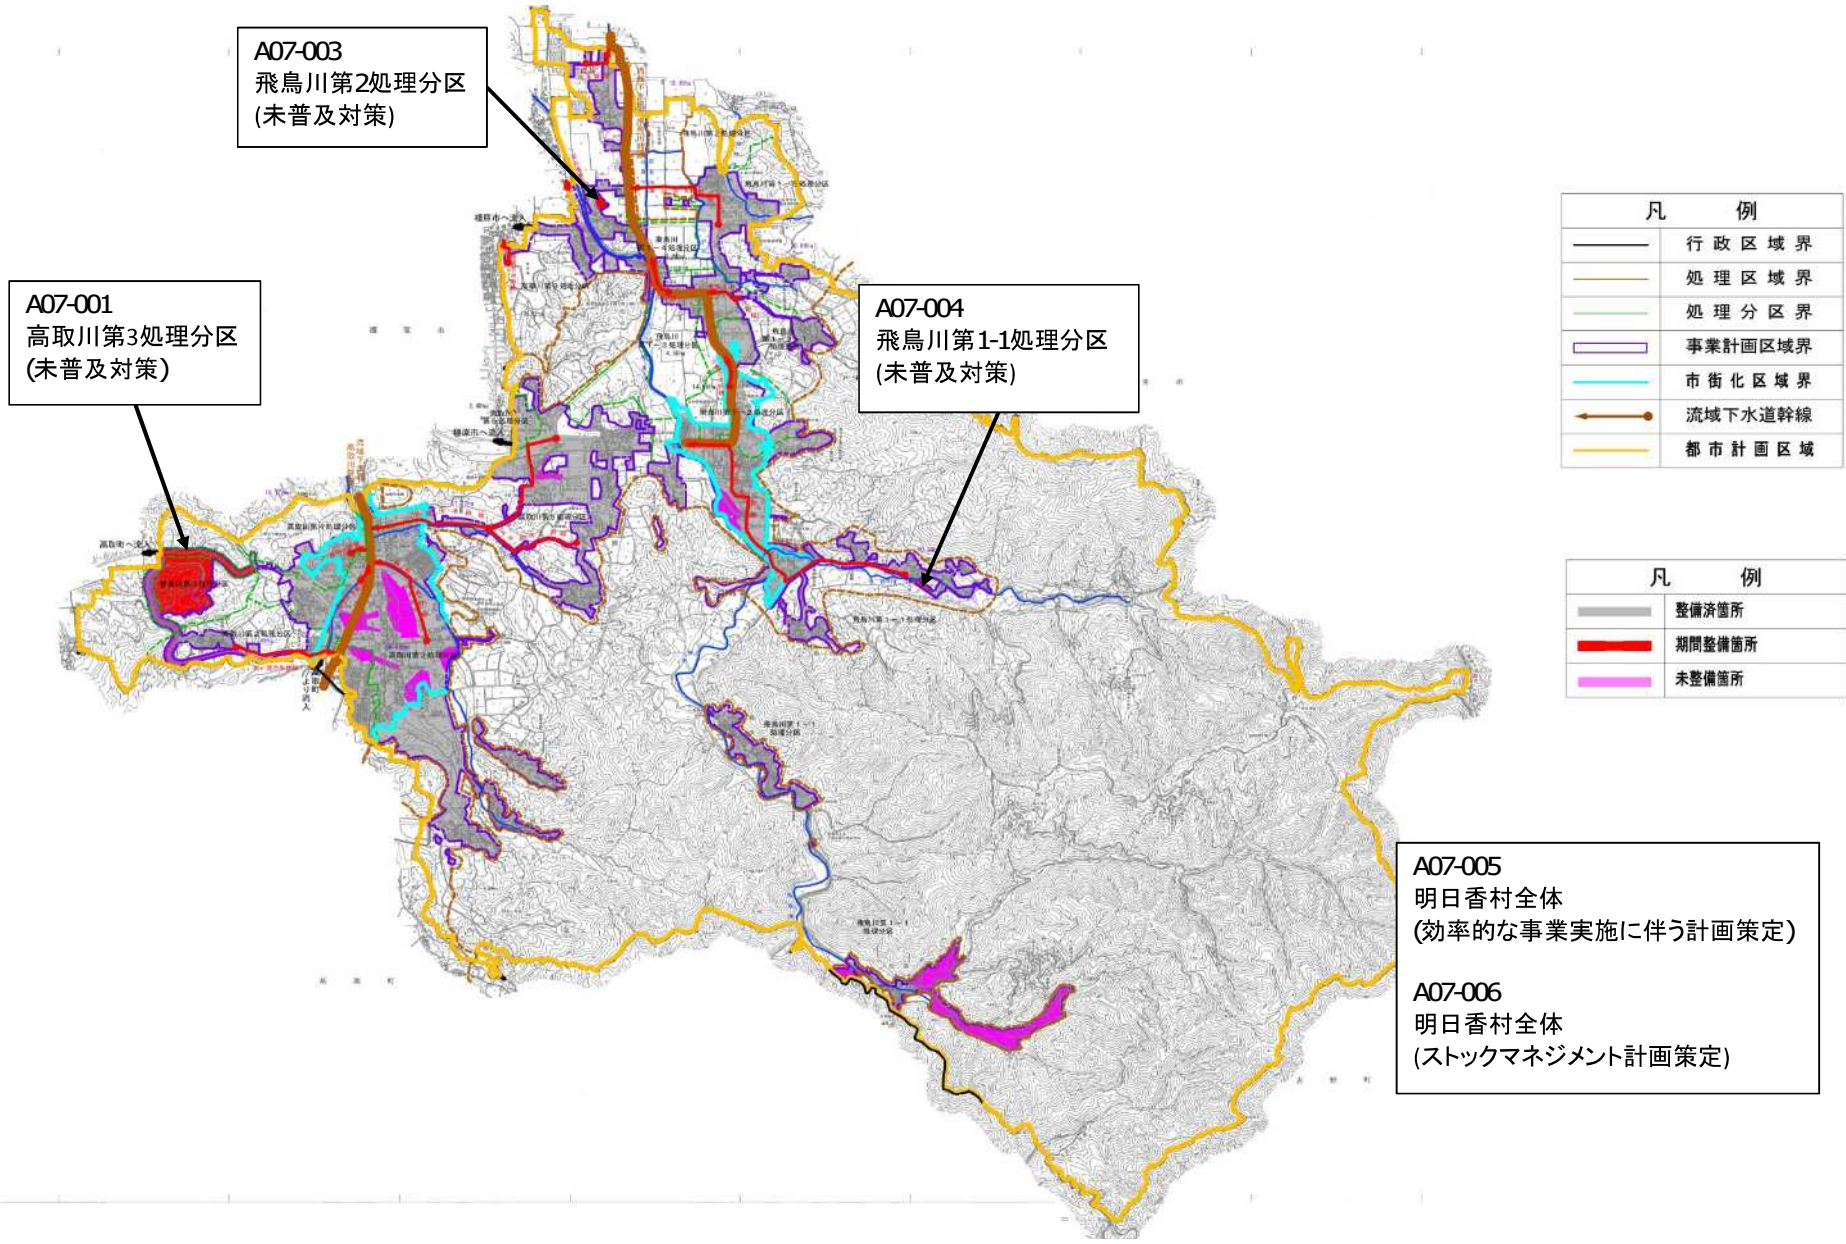

(参考様式 3)

(参考図面) 社会資本総合整備計画(水の安全・安心基盤整備)


計画の名称	明日香村における快適で活力ある暮らしの実現と下水道施設における事業継続性の確保。(第2期)		
計画の期間	平成29年度 ~ 平成33年度 (5年間)	交付対象	明日香村

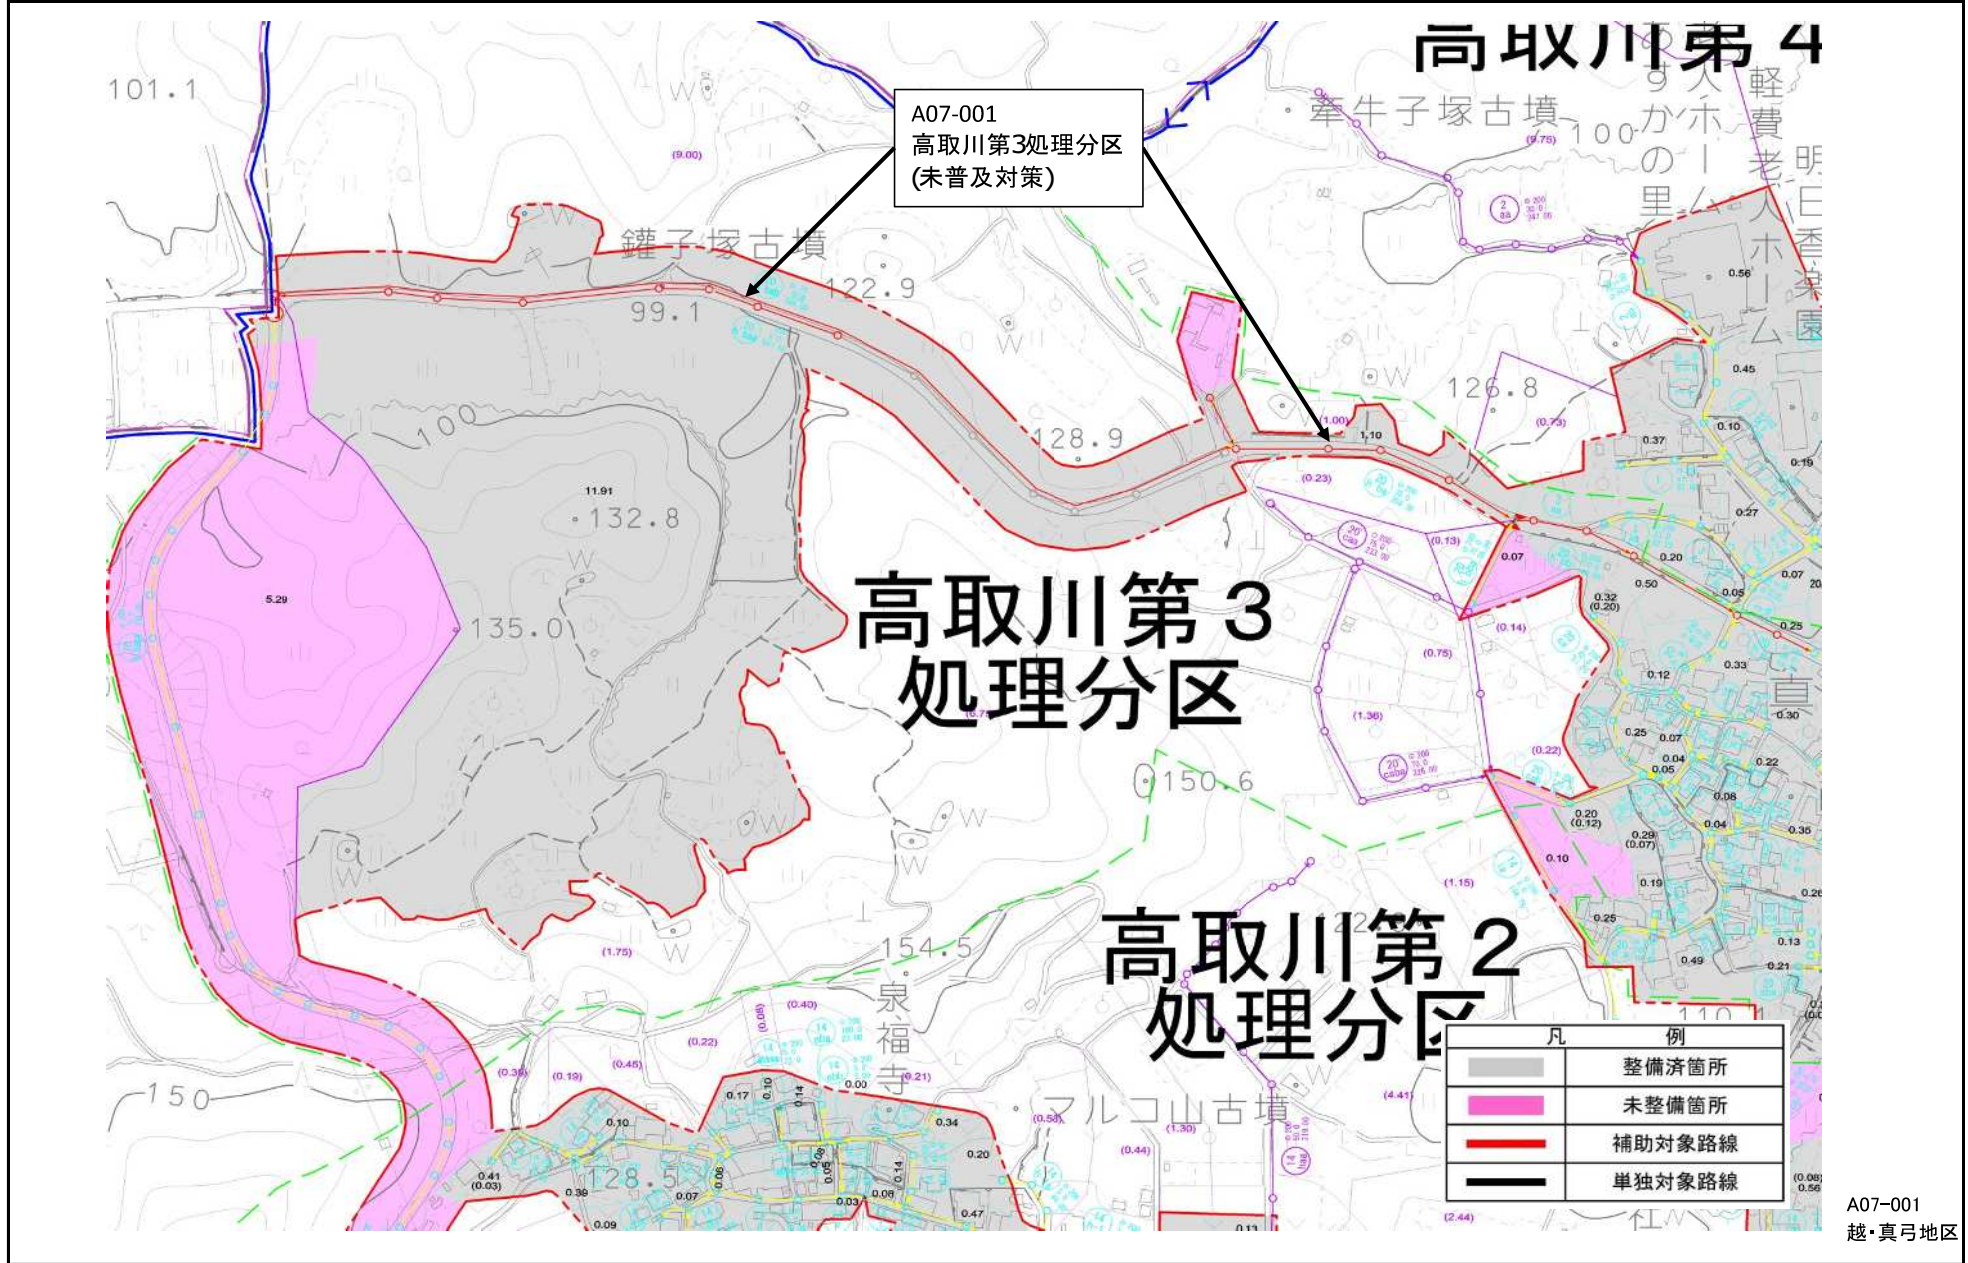

(参考様式 3)

(参考図面) 社会資本総合整備計画(水の安全・安心基盤整備)

計画の名称	明日香村における快適で活力ある暮らしの実現と下水道施設における事業継続性の確保。(第2期)		
計画の期間	平成29年度 ~ 平成33年度 (5年間)	交付対象	明日香村

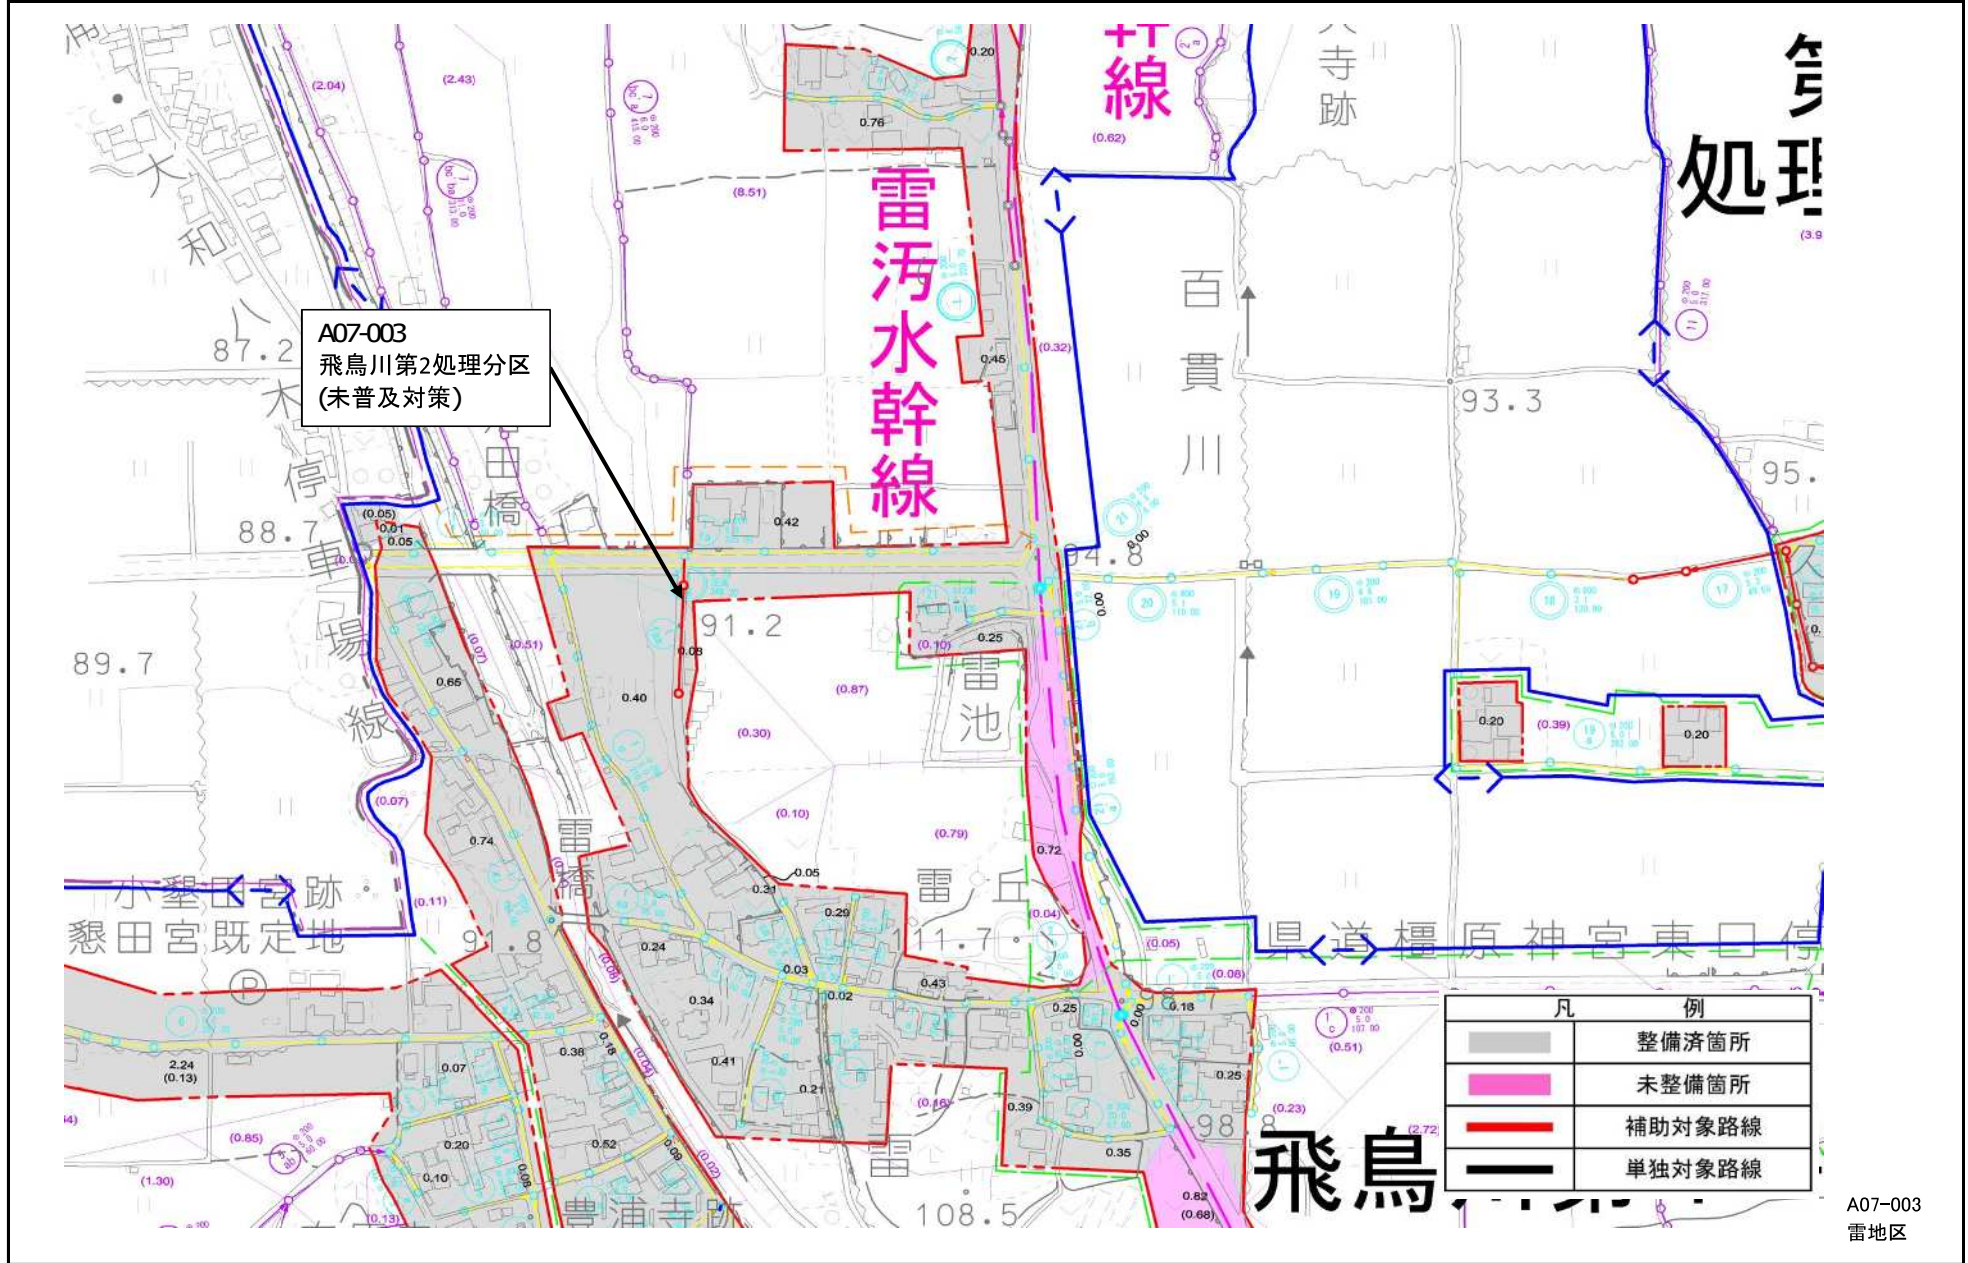

A07-003
雷地区

(参考様式 3)

(参考図面) 社会資本総合整備計画(水の安全・安心基盤整備)

計画の名称	明日香村における快適で活力ある暮らしの実現と下水道施設における事業継続性の確保。(第2期)		
計画の期間	平成29年度 ~ 平成33年度 (5年間)	交付対象	明日香村

